

<b>1. DATOS GENERALES</b>	
<b>CIUDAD Y FECHA:</b> Bogotá, Septiembre de 2016	
<b>DEPENDENCIA:</b> OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016</b>	
<b>OBJETIVO:</b> Dar a conocer a los responsables de los Proyectos de Inversión y a la Alta Dirección el estado actual de los proyectos, productos del seguimiento efectuado y reporte de actividades y ejecución Presupuestal a la Oficina Asesora de Planeación.	
<b>ACTIVIDADES:</b> La Oficina de Control Interno, brinda acompañamiento y realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del Presupuesto Nacional.	
<b>RESPONSABLE:</b> Oficina Asesora de Planeación	
<b>PLAZO PREVISTO:</b> N/A	
<b>FECHA INICIO:</b> Septiembre de 2016	<b>FECHA FINAL:</b> Septiembre de 2016
<b>2. EJECUCIÓN</b>	
<b>ASPECTOS GENERALES:</b>	
<p>La Oficina de Control Interno, brinda acompañamiento y realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto Nacional de la vigencia a las áreas que tienen a su cargo la ejecución de los Proyectos de Inversión del Archivo General de la Nación.</p> <p>Presentamos a continuación el avance de los siete ( 7 ) Proyectos de Inversión que se tienen inscritos en el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2016 por parte del Archivo General de la Nación.</p>	
<b>PROYECTOS INSCRITOS EN EL DPN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Diez mil ciento siete millones de pesos (\$ 10.107.000.000).</li> <li>2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional - SINAE por valor de Doscientos doce mil millones de pesos (\$ 212.000,000).</li> <li>3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, por valor de Dos mil ochocientos cincuenta millones de Pesos (\$2.850.000.000).</li> <li>4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Públicas Liquidadas. Por valor de Diez mil ciento cincuenta millones de pesos (\$ 10.150.000.000).</li> <li>5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Tres mil millones de Pesos (\$ 3.000.000,000).</li> <li>6. Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación por valor de Quinientos millones de Pesos (\$ 500.000.000).</li> <li>7. Renovación e implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación. Por valor de Tres mil millones de Pesos ( \$ 3.000.000,000).</li> </ol>	

**DESCRIPCION DE EVIDENCIA:**

Se puede evidenciar que a la fecha se encuentra bloqueado presupuesto de proyectos, los cuales se encuentran aplicados en SIIF NACIÓN, pero a la fecha no ha salido el Decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico aprobando dichos bloqueos.

Por lo anterior teniendo en cuenta el bloqueo del presupuesto los proyectos se encuentran en el mes de agosto de 2016, con la siguiente inversión:


1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos se encuentra en Nueve mil ciento cincuenta y un millones noventa y dos mil setecientos ochenta y cinco pesos. (\$ 9.151.092.785.00)
2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional - SINAIE por valor de Doscientos doce mil millones de pesos (\$ 212.000,000).
3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, por valor de Un mil ochenta millones de pesos (\$1.080.000.000).
4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Públicas Liquidadas. Por valor de Nueve mil quinientos cincuenta millones de pesos (\$ 9.550.000.000).
5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Dos Mil doscientos setenta y seis millones ochocientos ochenta mil ochocientos noventa y cinco pesos (\$2.276.880.895).
6. Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación por valor de Quinientos millones de pesos (\$500.000.000).
7. Renovación e implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación. Por valor de Dos mil cuarenta y tres millones novecientos ochenta y nueve Mil trescientos cincuenta y cuatro pesos ( \$ 2.043.989.354).

**AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A AGOSTO DE 2016**

**Ejecución de los Proyectos de Inversión frente a la Apropiación sin tener en cuenta el bloqueo de Apropiación.**

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación	\$500.000.000	96.58%	67.12%	67.12%
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	\$2.850.000.000	20.19	4.28%	4.28%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	\$10.150.000.000	1.11%	0.38%	0.38%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	\$3.000.000.000	57.34%	35.56%	34.75%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	\$10.106.963.034	65.12%	34.82%	30.09%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	\$3.000.000.000	64.22%	30.96%	30.61%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	\$ 212.000.000	97.83%	54.47%	36.50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$29.818.963.034</b>	<b>38.92%</b>	<b>20.54%</b>	<b>18.70%</b>

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION SIN BLOQUEO  
CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2016**

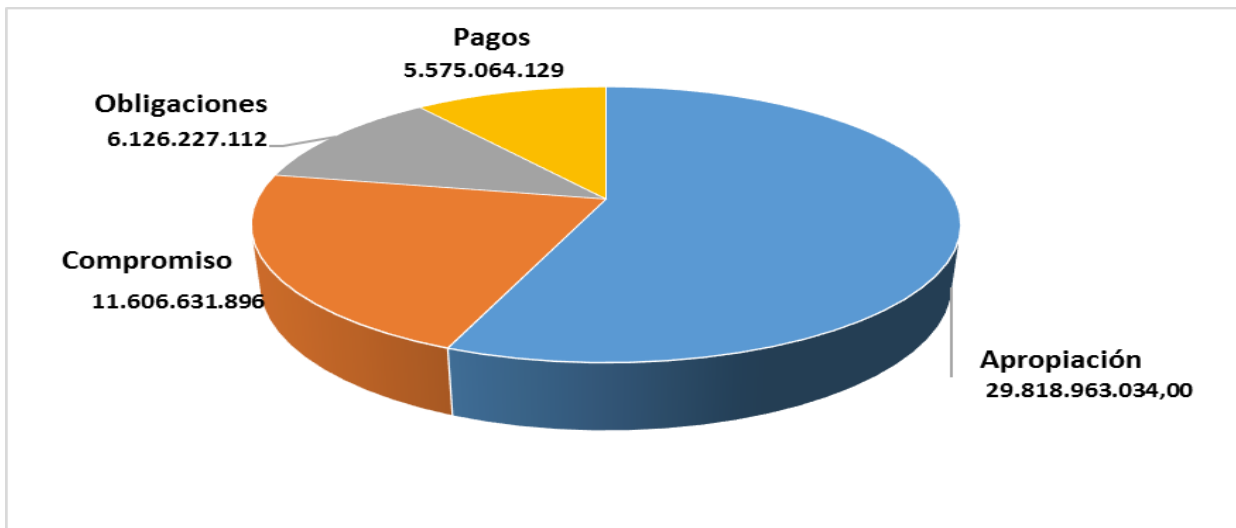


**Ejecución de los Proyectos de Inversión frente a la Apropiación con bloqueo de Apropiación.**

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación	\$500.000.000	96.58%	67.12%	67.12%
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	\$1.080.000.000	53.29%	11.29%	11.29%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	\$9.550.000.000	1.18%	0.40%	0.40%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	\$2.043.989.354	84.16%	52.19%	51.00%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	\$9.156.092.785	71.92%	38.46%	33.23%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	\$2.276.880.895	84.62%	40.79%	40.33%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	\$ 212.000.000	97.83%	54.47%	36.50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$24.818.963.034</b>	<b>46.77%</b>	<b>24.69%</b>	<b>22.47%</b>

Fuente: Oficina de Planeación

APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>24.818.963.034</b>	<b>11.606.631.895.70</b>	<b>6.126.227.111.84</b>	<b>5.575.064.129</b>
EJECUCION Y/O APROBACION	46.77%	24.69%	22.47%

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION  
CON BLOQUEO EN LA APROPIACION  
CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2016**

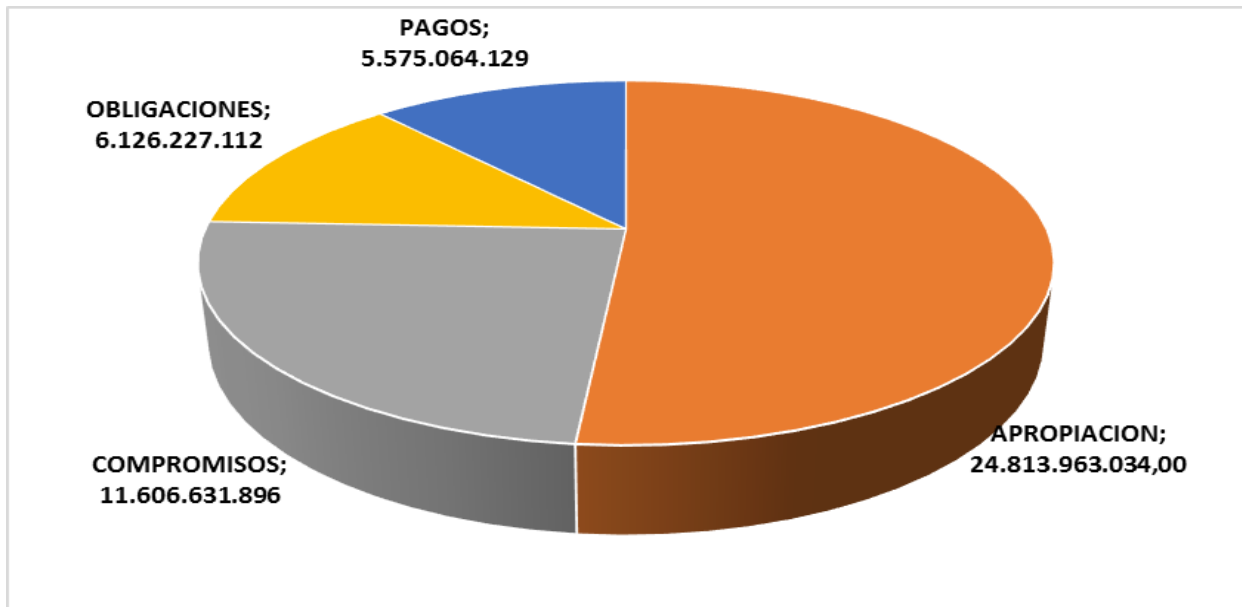


Fuente: Oficina de Planeación

A continuación se relacionan por proyecto el avance físico y financiero de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta los bloqueos realizados a las Apropiedades y que fueron aplicados en SIIF NACIÓN.

**1. Remodelación y Adquisición del Inmueble Aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación**

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Remodelación y Adquisición del Inmueble Aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación	500.000.000	482.921.077	335.602.797	335.602.797	96,58%	67,12%

Fuente: Oficina de Planeación

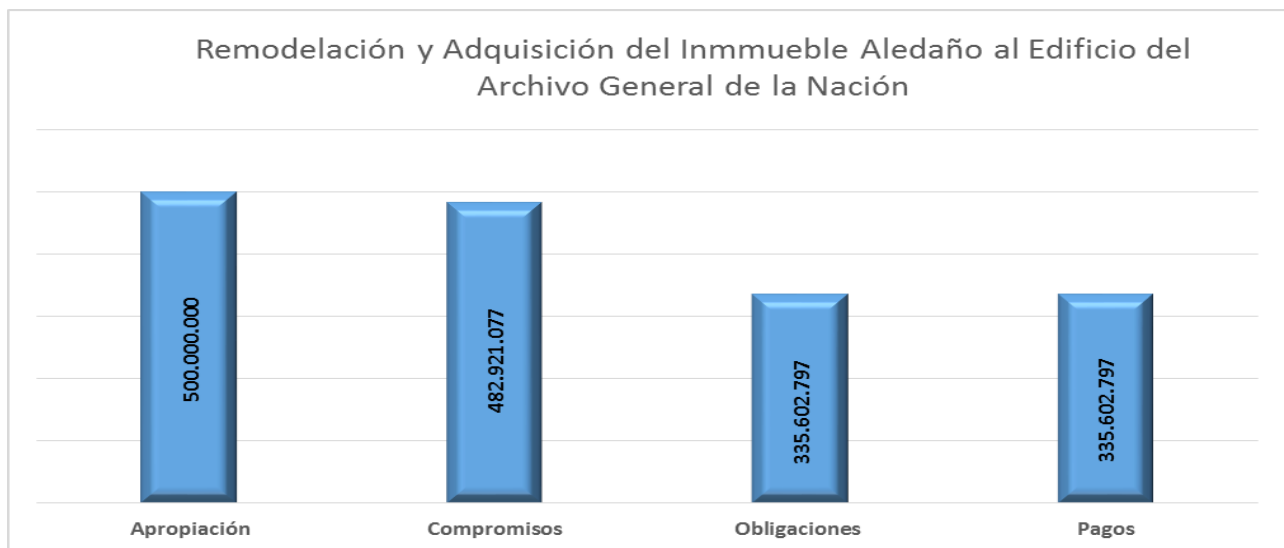


Fuente: Oficina de Planeación

## 2. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Mantenimiento y adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación.	1.080.000.000,00	575.528.264	121.923.803	121.923.803	53,29%	11,29%

Fuente: Oficina de Planeación

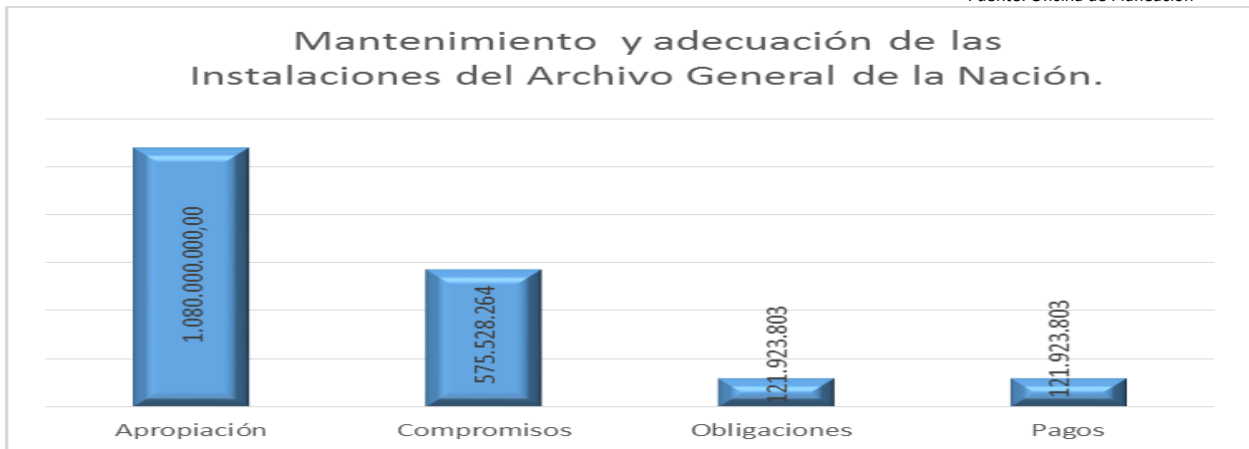

Fuente: Oficina de Planeación

## 3. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo intermedio.

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Mejoramiento, Dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en Funcionamiento del Archivo Intermedio entidades Financieras Publicas liquidadas.	9.550.000.000,00	112.578.014	38.389.306	38.389.306	1,11%	0,38%

Fuente: Oficina de Planeación

Mejoramiento, Dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en Funcionamiento del Archivo Intermedio entidades Financieras Publicas liquidadas.



Fuente: Oficina de Planeación - Datos en miles de pesos

#### 4. Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación.	2.043.989.354,00	1.720.172.173	1.066.744.349	1.042.473.073	57,34%	34,75%

Fuente: Oficina de Planeación



Fuente: Oficina de Planeación

#### 5. Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	9.151.092.785,00	6.581.367.822	3.519.343.355	3.041.126.452	71,92%	33,23%

Fuente: Oficina de Planeación




Fuente: Oficina de Planeación

## 6. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano.	2.276.880.895,00	1.926.664.833	928.740.722	918.165.918	84,62%	40,33%

Fuente: Oficina de Planeación

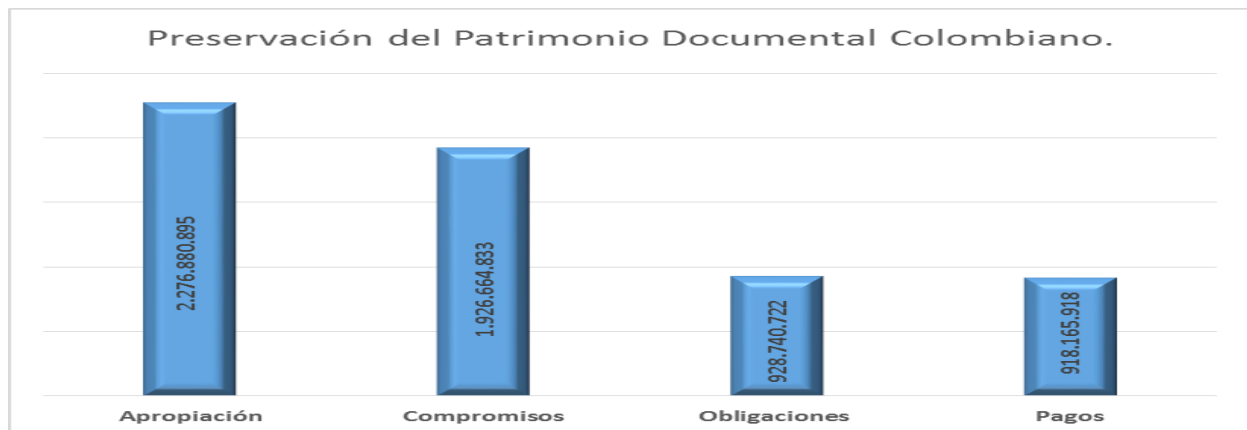

Fuente: Oficina de Planeación

## 7. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional

Proyecto	Apropiación	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto al Compromiso)	% de Avance Financiero ( Pagos Respecto a la Apropiación Definitiva)
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional.	212.000.000,00	207.399.713	115.482.780	77.382.780	97,83%	36,50%

Fuente: Oficina de Planeación



Fuente: Oficina de Planeación

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**

Avance de los siete (7) proyectos que se encuentran registrados en el Departamento Nacional de Planeación.

<b>Proyecto: REMODELACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE ALEDAÑO AL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</b>								
<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$500</b>							
<b>Seguimiento / Mes</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>
% AVANCE FÍSICO	0,00%	0,00%	13,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%	100,0%
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,16%	1,31%	1,31%	6,62%	67,12%	67,12%	67,12%
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	2,60%	2,60%	82,60%	100,0%	100,0%	100,00%
<b>Proyecto: IMPLANTACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA</b>								
<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$10.506</b>							
<b>Seguimiento / Mes</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>
% AVANCE FÍSICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,00%	84,00%	87,00%	95,00%
% AVANCE FINANCIERO	1,24%	2,97%	7,26%	10,04%	14,31%	19,58%	25,36%	33,50%
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	25,75%	40,75%	59,25%
<b>Proyecto: RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</b>								
<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$3.000</b>							
<b>Seguimiento / Mes</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>
% AVANCE FÍSICO	0,00%	0,00%	17,00%	17,00%	38,00%	52,00%	69,00%	69,00%
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,10%	1,57%	2,18%	3,60%	26,34%	32,89%	35,56%
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
<b>Proyecto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</b>								
<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$2.850</b>							
<b>Seguimiento / Mes</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>
% AVANCE FÍSICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	14,00%	27,00%
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,00%	0,40%	0,48%	0,67%	3,81%	4,00%	4,28%
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%
<b>Proyecto: MEJORAMIENTO DOTACION Y ADECUACION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS LIQUIDADAS</b>								
<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$10.150</b>							
<b>Seguimiento / Mes</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>
% AVANCE FÍSICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	20,00%
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,12%	0,20%	0,28%	0,38%
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%



Proyecto: PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO								
INVERSIÓN	\$3.000							
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	48,00%	32,00%	32,00%	33,00%
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,00%	4,08%	6,73%	12,54%	18,86%	24,79%	30,96%
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	13,00%	13,00%	45,00%	51,00%	76,00%	100,00%
Proyecto: APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTÓNICOS - SINAE								
INVERSIÓN	\$212							
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%	8,00%	8,00%	11,00%	31,00%
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,00%	9,96%	9,96%	17,04%	22,54%	29,52%	54,47%
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%
Cifras en millones de pesos								
INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO			FRECUENCIA DEL CONTROL			RESULTADOS		
INDICADOR DE EFICIENCIA			RECURSOS PLANIFICADOS RECURSOS UTILIZADOS			MENSUAL Grado de Ejecución Presupuestal		
OBSERVACIONES:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La Oficina de Planeación dio cumplimiento a la directriz de presidencia sobre austeridad y se efectuó el bloqueo de presupuesto del 1%.</li> <li>✓ Con oficio NO. 2-2016-03673 se solicitó reducción de recursos presupuestales por valor de \$4.000.000.000.</li> <li>✓ No se ha realizado la reducción del valor de la Inversión de los Proyectos ante el Departamento Nacional de Planeación.</li> <li>✓ Con corte a 31 de Agosto de 2016 el Archivo General de la Nación tiene un presupuesto bloqueado de \$ 4. 399.746.232. Dicha información ya se encuentra aplicada en SIIF NACIÓN.</li> <li>✓ Con corte a 31 de Agosto la ejecución del compromiso se encuentra en un 46.77% con respecto a la Apropriación, pendiente por comprometer el 53.23%.</li> <li>✓ La Ejecución de la obligación con respecto a la apropiación se encuentra en un 24.69%, pendiente por ejecutar 73.31%.</li> <li>✓ Los pagos se encuentra en el 22.47%, pendiente por pagar el 77.53%.</li> <li>✓ El Proyecto Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo de las Entidades Financieras Publicas Liquidadas se encuentra con una baja ejecución del compromiso, teniendo en cuenta que con corte a Agosto 31 de 2016 ,se han constituido CDPs, por valor de 112.578.014, que corresponde a un 1.18%</li> <li>✓ De acuerdo a lo reportado al Departamento Nacional de Planeación, se evidencia que existen proyectos entre el 50% y menor de 50% de avance de Gestión como son: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación que se encuentra en un 34% de avance de gestión.</li> <li>▪ Mejoramiento Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Publicas Liquidadas, tiene un avance de Gestión del 15%.</li> <li>▪ Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación, tiene un avance de Gestión del 50%.</li> </ul> </li> </ul>								

4. DATOS FINALES	
FECHA : Septiembre 27 de 2016	ESTADO DE CONSECUCCIÓN: Finalizado
<b>DIFICULTADES:</b> Dificultad en la Gestión de los proyectos de inversión por parte de los responsables de la ejecución los mismos.	
<b>RECOMENDACIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se recomienda a los responsables de los proyectos de inversión, hacer seguimiento a la ejecución presupuestal para cumplir con las metas propuestas en la presente vigencia.</li> <li>✓ Agilizar los trámites administrativos.</li> <li>✓ Los proyectos con gestión menor o igual al 50% deben implementar de manera URGENTE planes de ejecución que permitan dar cuenta del cumplimiento del ejercicio presupuestal y de metas al final de la vigencia.</li> </ul>	
NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
ROBERTH DANIELS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ANEXOS: N/A	
 <b>HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO</b> Jefe Oficina de Control Interno	 <b>CARMEN ALICIA DANIES HERNANDEZ</b> Profesional Oficina de Control Interno
